

# 破碎・選別計画概要（久慈地区）

(株)奥村組・宮城建設(株)・(株)中塚工務店  
・(株)晴山石材建設 特定業務共同企業体


## ■ 業務概要

- (1) 業務名：久慈地区災害廃棄物破碎・選別等(その2)業務委託
- (2) 発注者：岩手県
- (3) 履行期間：平成25年 3月1日～平成26年 3月31日
- (4) 委託数量：50,688 t

【内訳】


① 可燃系混合物	1,125 t
② 不燃系混合物	5,400 t
③ コンクリートがら	44,163 t

## 1. 業務位置図

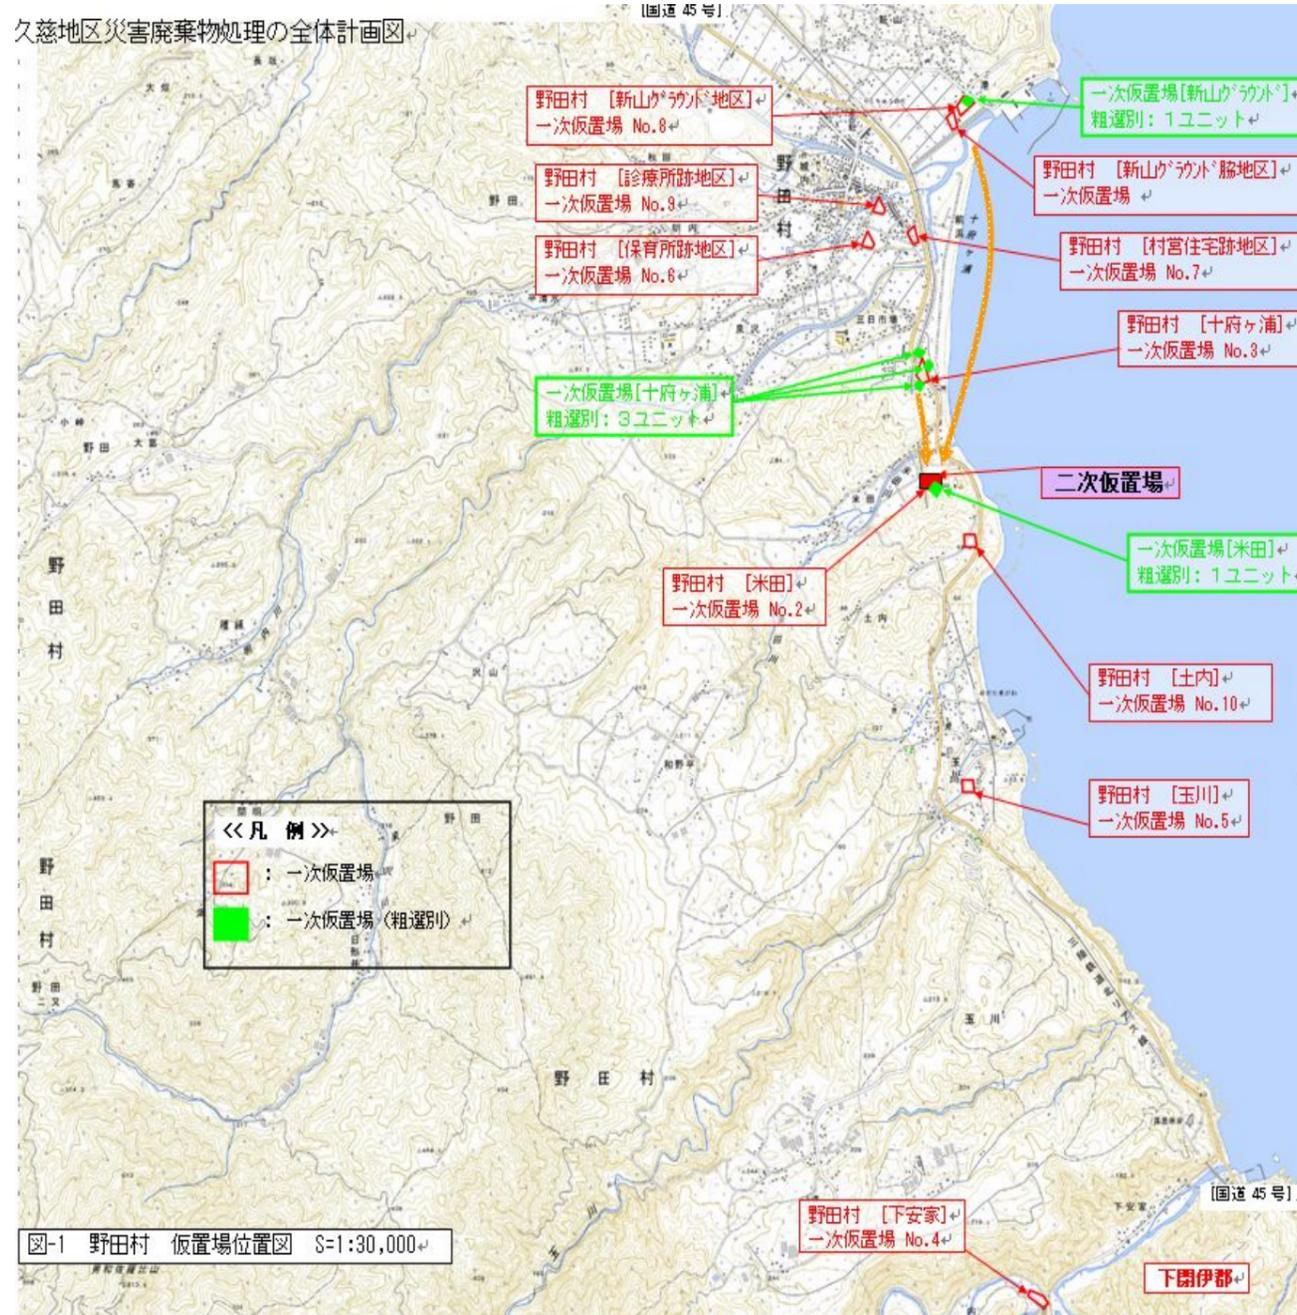

一次仮置場・二次仮置場 位置図


## 2. 一次仮置場工（粗選別工）

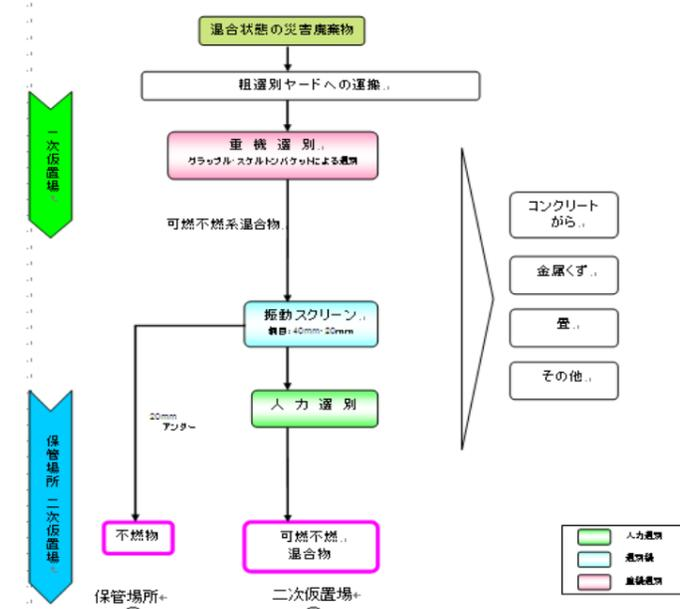

## 一次仮置場での施工フロー

### 【一次仮置場での施工方法】


- ① 積み上げられた災害廃棄物をグラップル1台が掻き出し、大型廃棄物（木くず、金属くず、コンクリートがら、漁具等）を選別する。
- ② ①の残渣をスケルトンバケットで篩い、250mmオーバーと250mmアンダーに分ける。
- ③ ②の250mmオーバーは、グラップルと手選別によって破碎不適物（金属、コンクリートがら等）を取り除いた後二次仮置場へ搬出する。
- ④ ②の250mmアンダーは、粗選別機（振動スクリーン）に投入し40mmオーバーと40mmアンダーに選別する。
- ⑤ ④の40mmアンダー及び40mm～250mmは二次仮置場へ搬出する。

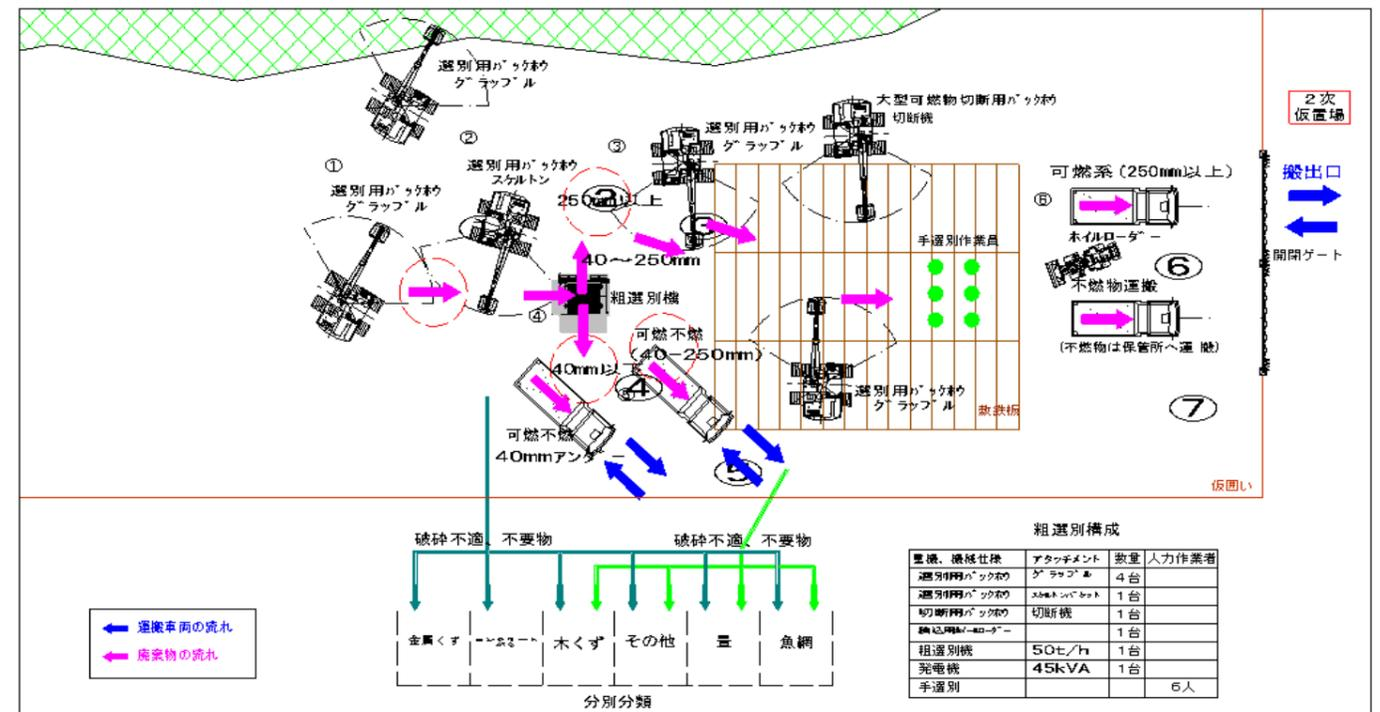


一次仮置場での施工方法

### 3. 二次仮置場工（破碎・選別工）


一次仮置場  
二次仮置場

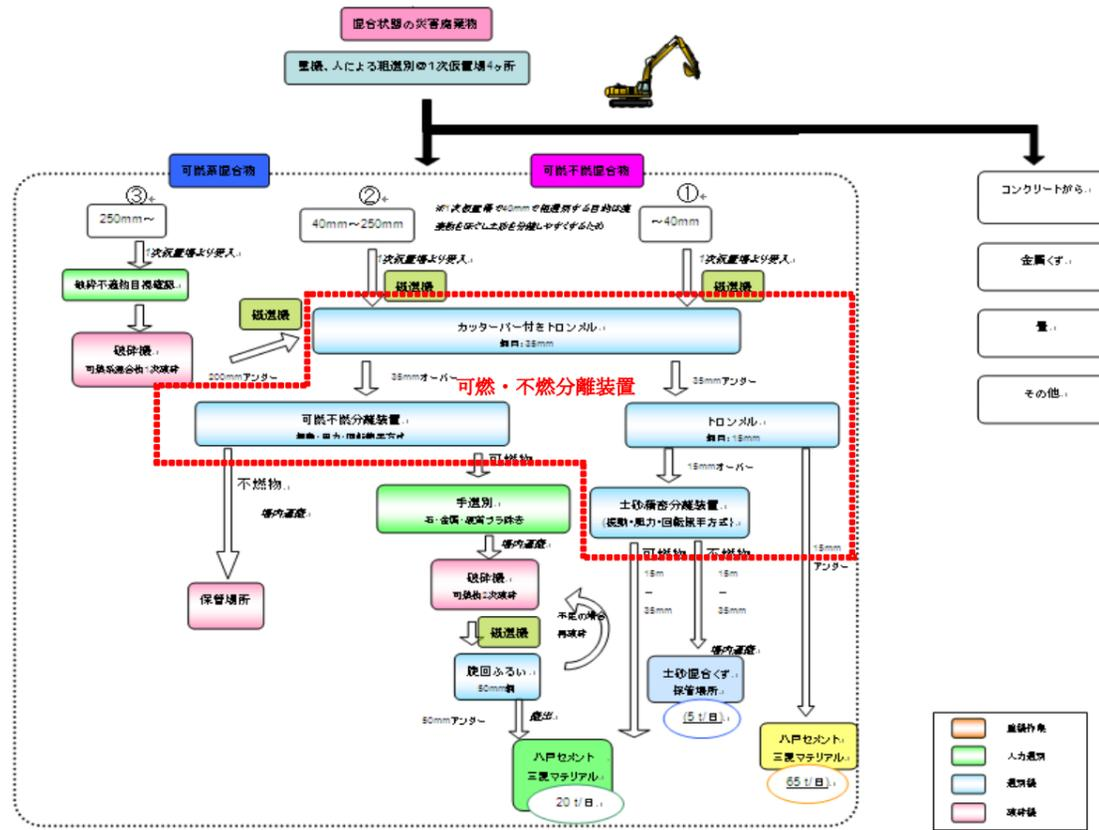

二次仮置場での施工フロー

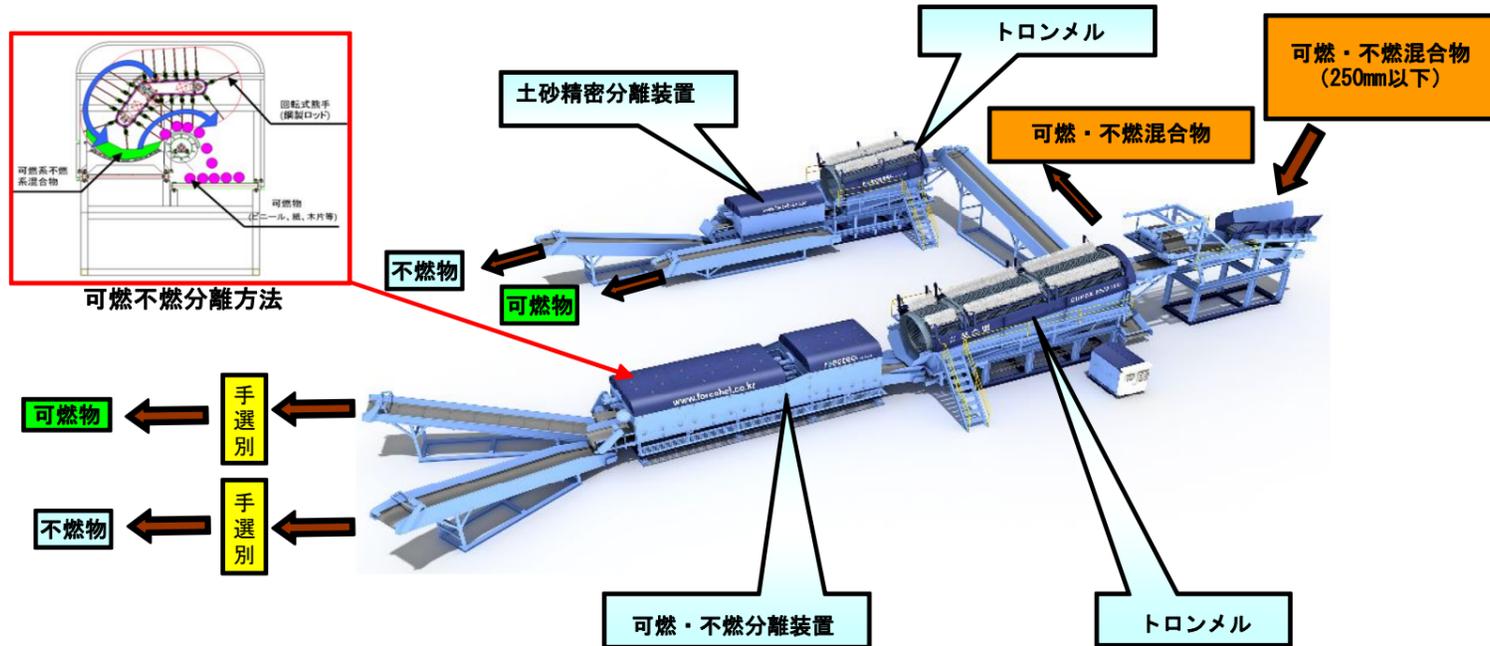

可燃・不燃分離装置一般図

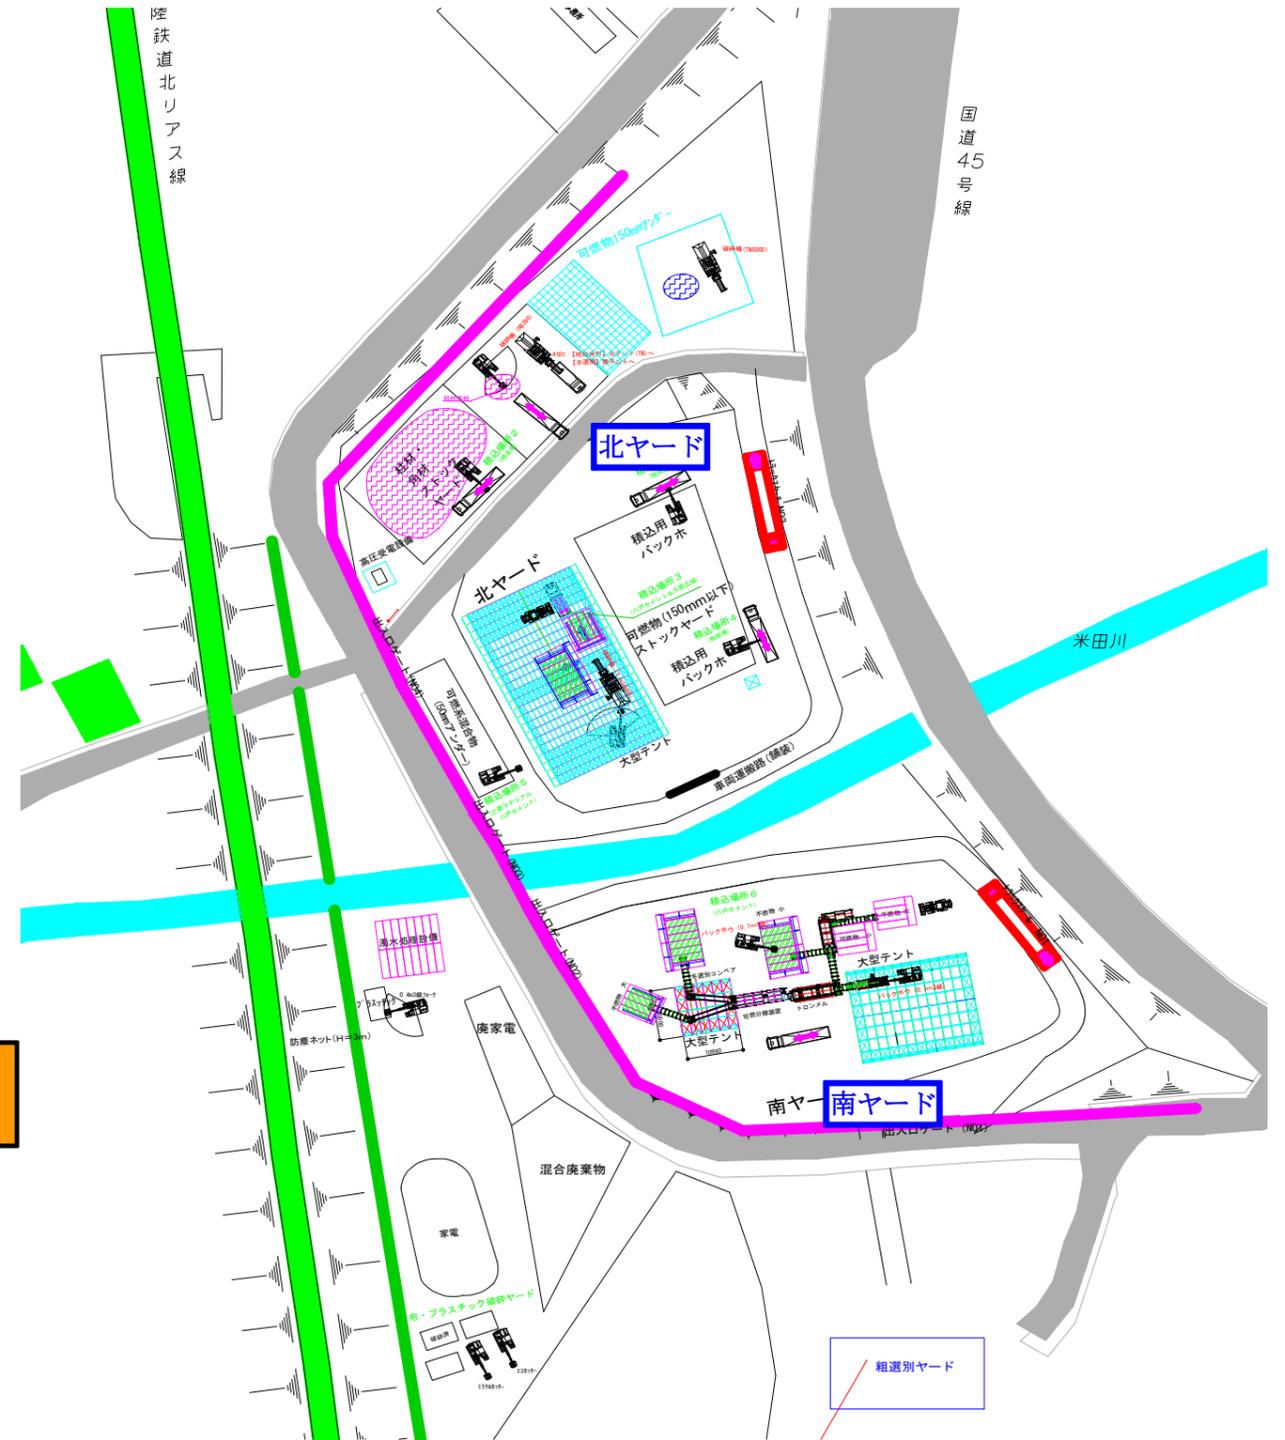

二次仮置場設備配置図
